RELATÓRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO

# Resumo executivo

Obra Juscelino Mola

Período
08/09/2026 a 30/10/2026

| TOTAL APURADO | MATERIAIS | MÃO DE OBRA | ABASTECIMENTOS |
|---|---|---|---|
| **R$ 27.119,36** | **R$ 19.191,02** | **R$ 7.495,00** | **R$ 433,34** |
| 27 compras e 66,5 diárias | 22 lançamentos | 71 diárias | 5 lançamentos |

## Distribuição por categoria

| | | |
|---|---|---|
| Materiais da obra | **R$ 19.191,02** | 70,8% |
| Mão de obra | **R$ 7.495,00** | 27,6% |
| Abastecimentos | **R$ 433,34** | 1,6% |

## Materiais por etapa

| | | |
|---|---|---|
| Etapa 1 - Sapata | **R$ 7.441,68** | 38,8% |
| Etapa 2 - Alvenaria | **R$ 6.675,44** | 34,8% |
| Antes de Iniciar | **R$ 5.073,90** | 26,4% |

Base: R$ 19.191,02

## Principais fornecedores

| | | |
|---|---|---|
| Martins Ferragens | **R$ 10.626,70** | 55,4% |
| 3 Irmãos | **R$ 6.350,00** | 33,1% |
| Mega Nordeste | **R$ 1.095,42** | 5,7% |
| Ldf | **R$ 618,30** | 3,2% |
| Prefeitura | **R$ 400,00** | 2,1% |

## Mão de obra · teto contratado

Executado **R$ 7.495,00** — Teto R$ 32.000,00

23,4% do teto utilizado · saldo R$ 24.505,00

| R$ 7.265,00 | R$ 230,00 |
|---|---|
| Pago | A pagar |

## Pagamentos e compradores

| | | |
|---|---|---|
| Cartão de crédito | **R$ 18.771,02** | 97,8% |
| PIX | **R$ 420,00** | 2,2% |

Compradores (materiais)

| | | |
|---|---|---|
| Alberto | **R$ 9.462,20** | 49,3% |
| Ives | **R$ 8.633,40** | 45,0% |
| Ives & Alberto | **R$ 1.095,42** | 5,7% |

## Destaques

| R$ 700,00 | Martins Ferragens | R$ 3.874,19 |
|---|---|---|
| Economia registrada nos aterros da prefeitura | Maior fornecedor · 55,4% dos materiais | Média semanal em 7 semanas |

RELATÓRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO

# Materiais e abastecimentos

Obra Juscelino Mola

Período
08/09/2026 a 30/10/2026

## Materiais da obra · R$ 19.191,02

| # | DATA | DESCRIÇÃO · FORNECEDOR · COMPRADOR | ETAPA | PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09 | Material das câmeras<br>Martins Ferragens · Ives | Antes de Iniciar | Cartão · 3x | R$ 150,50 |
| 2 | 08/09 | Material das câmeras parte 2<br>Constrular · Ives | Antes de Iniciar | Cartão · 2x | R$ 64,60 |
| 3 | 11/09 | Compra do aterro a prefeitura - nivelar terreno 12m<br>Prefeitura · Ives | Antes de Iniciar | PIX | R$ 150,00 |
| 4 | 12/09 | Compra de ferramentas e acessórios<br>Martins Ferragens · Ives | Antes de Iniciar | Cartão · 6x | R$ 426,40 |
| 5 | 14/09 | Materiais para iniciar a obra<br>Martins Ferragens · Ives | Antes de Iniciar | Cartão · 6x | R$ 4.282,40 |
| 6 | 16/09 | Conexões - quebra do cano da vizinha<br>Silas Ferragens · Alberto | Etapa 1 · Sapata | PIX | R$ 16,00 |
| 7 | 16/09 | Conexão - quebra do cano da vizinha<br>Silas Ferragens · Alberto | Etapa 1 · Sapata | PIX | R$ 4,00 |
| 8 | 22/09 | Cavador articulado<br>Martins Ferragens · Ives | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 6x | R$ 59,90 |
| 9 | 22/09 | Cimento e pedra calcária<br>Martins Ferragens · Ives | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 6x | R$ 1.189,00 |
| 10 | 23/09 | Comprar tabuas mistas e disco de corte<br>Martins Ferragens · Ives | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 6x | R$ 482,60 |
| 11 | 25/09 | 12 treliça de 6 mt<br>Mega Nordeste · Ives & Alberto | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 4x | R$ 321,00 |
| 12 | 25/09 | 6 - colunas de ferro 5/16 ferro 8 com 6 mts<br>Mega Nordeste · Ives & Alberto | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 4x | R$ 448,98 |
| 13 | 28/09 | 20 - cimento / 6 - mt areia grossa<br>Martins Ferragens · Ives | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 6x | R$ 1.578,00 |
| 14 | 30/09 | Radier - tijolo - cimento<br>Martins Ferragens · Alberto | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 6x | R$ 2.418,00 |
| 15 | 02/10 | Treliça que faltou<br>Martins Ferragens · Alberto | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 1x | R$ 39,90 |
| 16 | 05/10 | Broxa para aplicar massa asfaltica<br>Michel Casa & Const · Alberto | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 1x | R$ 16,00 |
| 17 | 05/10 | Carro de mão e massa asfaltica<br>Ldf · Alberto | Etapa 1 · Sapata | Cartão · 3x | R$ 618,30 |
| 18 | 07/10 | Compra do aterro a prefeitura - nivelar terreno 12m<br>Prefeitura · Ives | Etapa 1 · Sapata | PIX | R$ 250,00 |
| 19 | 08/10 | Tijolo / cimento / vadelit / canaleta /<br>3 Irmãos · Alberto | Etapa 2 · Alvenaria | Cartão · 12x | R$ 4.280,00 |
| 20 | 13/10 | Treliça 6mt / cimento / tabuas de pinus / pneu carro de mão<br>3 Irmãos · Alberto | Etapa 2 · Alvenaria | Cartão · 12x | R$ 310,00 |
| 21 | 14/10 | Tabua mista / tijolo / cimento<br>3 Irmãos · Alberto | Etapa 2 · Alvenaria | Cartão · 12x | R$ 1.760,00 |
| 22 | 20/10 | 12 treliça de 6 mt<br>Mega Nordeste · Ives & Alberto | Etapa 2 · Alvenaria | Cartão · 6x | R$ 325,44 |
| **Total de materiais** | | | | | **R$ 19.191,02** |

## Abastecimentos · R$ 433,34

| # | DATA | DESCRIÇÃO · FINALIDADE | QUEM | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 | Abastecimento montana prata<br>Pegar material do erick p obra | Irae | R$ 53,34 |
| 2 | 15/09 | Abastecimento montana branca<br>R$ 100 - gasolina / r$ 50 - alco | Alberto | R$ 150,00 |
| 3 | 01/10 | Abastecimento montana prata<br>Pegar treliças mega nordeste | Alberto | R$ 30,00 |
| 4 | 05/10 | Abastecimento montana prata rager<br>Pegar material na ldf | Alberto | R$ 50,00 |
| 5 | 07/10 | Abastecimento montana branca | — | R$ 150,00 |
| **Total de abastecimentos** | | | | **R$ 433,34** |

RELATÓRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO


# Mão de obra

Obra Juscelino Mola

Período
08/09/2026 a 30/10/2026

| TOTAL EM DIÁRIAS | DIÁRIAS | PAGO | A PAGAR |
|---|---|---|---|
| R$ 7.495,00 | 66,5 | R$ 7.265,00 | R$ 230,00 |
| 23,4% do teto de R$ 32.000,00 | 7 profissionais | 96,9% | 3,1% |

## Custo por semana

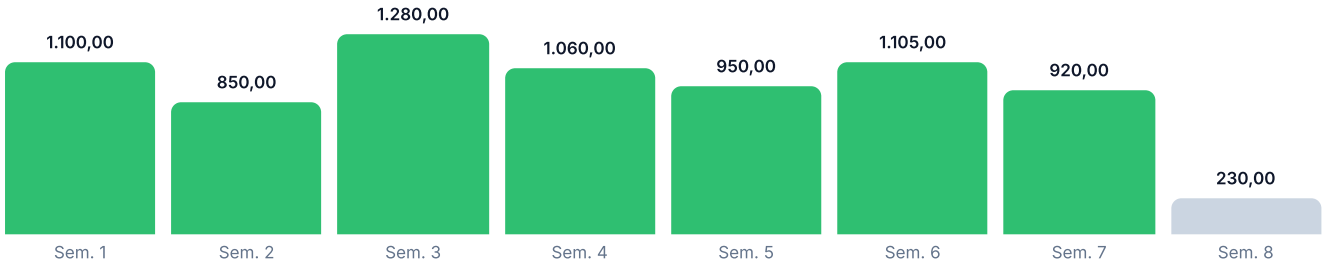


## Por profissional

| PROFISSIONAL | DIÁRIAS | VALOR | PART. |
|---|---|---|---|
| Isaias<br>Ajudante | 30 | **R$ 2.610,00** | 34,8% |
| Antônio<br>Pedreiro | 12,5 | **R$ 1.755,00** | 23,4% |
| Nildo<br>Mestre | 7,5 | **R$ 1.580,00** | 21,1% |
| Pedro<br>Ajudante | 8 | **R$ 650,00** | 8,7% |
| Jeferson<br>Ajudante | 3,5 | **R$ 360,00** | 4,8% |
| Francisco<br>Ajudante | 3 | **R$ 360,00** | 4,8% |
| Lucio<br>Ajudante | 2 | **R$ 180,00** | 2,4% |
| **Total** | **66,5** | **R$ 7.495,00** | |

## Ocorrências registradas

**Sem. 1** Nildo (mestre) supervisionou a obra várias vezes.

**Sem. 2** Sexta sem trabalho: choveu e as colunas não tinham chegado.

**Sem. 5** Moto do ajudante quebrou; sem expediente à tarde.

Responsável pela obra

Conferência financeira
